

1 – Plan de situation et Déviation



1-1 Déviation Poids Lourds



1-2 Déviation VL par phase

1-2-a Phase 1

Phase 1 – Travaux Carrefour de la rue de Puisieux
Durée 3 semaines


Alternat par feux sur la Rue de Sillery
Alternat par feux sur la Rue de Sillery



1-2-b Phase 2

Phase 2 – Travaux entre la rue de la Barre et la rue de Puisieux
Durée 3 semaines

Déviatoin depuis la rue Brulart par les rues : Brulart, Saint Remy, Abbé Fendler, Irma Noël, Sillery
Déviatoin depuis la rue de Puisieux par les rues : Mésanges, de la Source, Sillery

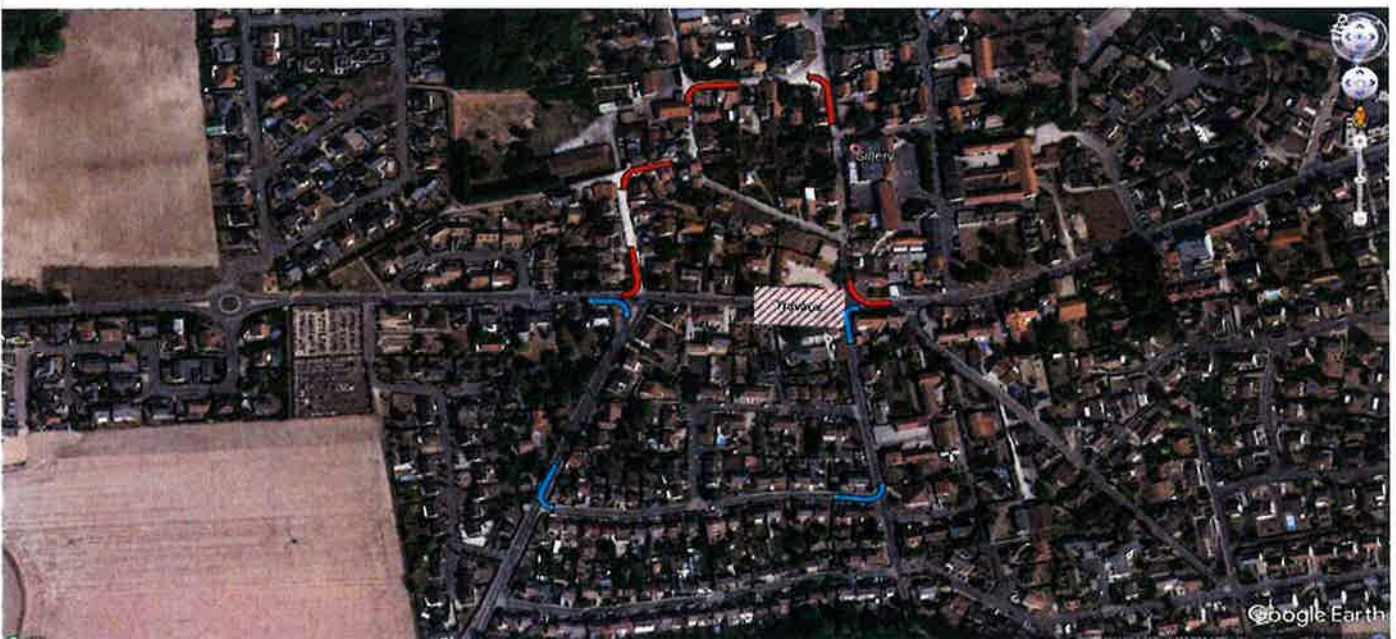

1-2-c Phase 3

Phase 3 – Travaux entre les rues Nicolas Brulard et rue de la Barre
Durée 4 semaines

Déviation depuis la rue Brulard par les rues : Brulart, Pressoir, de la Barre, Sillery
Déviation depuis la rue de la Source par les rues : Image, Vigneraie, Veau d'Or, Mailly



1-2-d Phase 4

Phase 4 – Travaux de chaussée
Durée 2 semaines

Déviation depuis la rue de Mailly par les rues : Veau d'Or, Image, Alouettes, Marronniers
Déviation depuis la rue de Sillery par les rues : Marronniers, Mésanges, Image, Veau d'Or



